

2008 특수공시 내역

순번	사업명	소요 예산 현황(백만원)			사업기간	공정율	확정여부
		총사업비	기투자	2007투자			
IT·BT분야							
1	정보화마을조성사업	6,447	4,647	1,185	'01~'08	90%	
2	오송 외국인투자지역 조성(301,789㎡)	45,131	-	11,283	'07~'09	25%	
3	보건환경연구원 이전청사 신축공사(5,636.5㎡)	12,000	-	1,491	'06~'10	12.4%	
4	충주의료원 이전신축 BTL 사업	59,300	-	1,000	'07~'11	1.7%	
건설·재난분야							
5	지방도정비 (25개소 64.5km)	256,645	85,527	54,415	'01~'11	59.8%	
6	수해상습지 개선사업 (19개소 73.7km)	102,103	14,508	17,929	'06~'09	31.8%	
7	수해복구사업 (2개소 10.2km)	17,972	143	17,829	'06~'07	100%	
8	국가지원지방도 (8개소 52.4km)	748,646	205,013	37,065	'00~'11	25%	
9	도시주거환경개선사업	71,334	50,796	4,036	'01~'10	65.5%	
웰빙·문화분야							
10	수목원 확대조성사업 (250ha)	6,000	3,600	1,500	'05~'09	85%	
11	대청호 관람테크 조성공사 (250ha)	1,000	-	40	'07~'08	4%	
복지분야							
12	경로당 심야전기보일러 설치 지원사업	11,690	1,680	1,680	'06~'10	28.7%	

1. 정보화마을 조성사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 도·농간 정보격차 해소 및 지역균형발전 도모
- 사업기간 : '01. 1.~ '08. 12.
- 사업량 : 21개소
- 사업내용 : 정보 콘텐츠 및 정보이용환경조성 구축
- 총 사업비 : 6,447백만원(국비 47%, 도비 26%, 시군비 27%)
 - 국비 3,034백만원, 도비 1,661백만원, 시군비 1,752백만원

□ 추진계획

총 사업계획			2007년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
21개소	2001. 02.~ 2008.02.	6,447백만원	4개소	1,200백만원

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후 집행		
6,447백만원	4,647백만원	1,185백만원	615백만원	90%	90%

○ 사업추진현황

- 4개소 조성완료
 - 국비(1개소) : 옥천 안내 현리
 - 도비(3개소) : 청원 낭성 귀래, 증평 증평 송산, 괴산 장연 방곡

□ 사업효과

- 지역 주민의 소득증대로 지역경제 활성화 및 도농간 정보격차 해소
- 다양한 콘텐츠 제공으로 지역 주민의 삶의 질 향상

2. 오송 외국인투자지역 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 외투기업 유치로 고용창출, 소득증대를 통한 지역경제 활성화 도모
- 사업기간 : 2007. 1. ~ 2009.12.
- 사업량 : 301,789m²
- 사업내용 : 오송 외국인 투자지역 조성을 위한 부지매입
- 총사업비 : 45,131백만원(국비75%, 도비25%)
 - 부지매입비

□ 추진계획

총 사업계획			2007년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1개소 (301,789m ²)	2007. 01 ~ 2009. 12	45,131백만원	1개소 (301,789m ²)	11,283백만원 (도비 부담액)

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후 집행		
45,131백만원	-	11,283백만원	34,848백만원	25%	25%

※ 국비는 지식경제부 직접 집행

○ 사업추진현황

- 오송 외국인투자지역 지정고시 및 부지매입계약 체결(2007. 7. 31)


□ 사업효과

- 첨단 바이오기업 유치를 통하여 국내 바이오산업 발전 도모
- 오송단지의 동북아 바이오허브로 육성에 기여

□ 위치도



□ 단지배치도

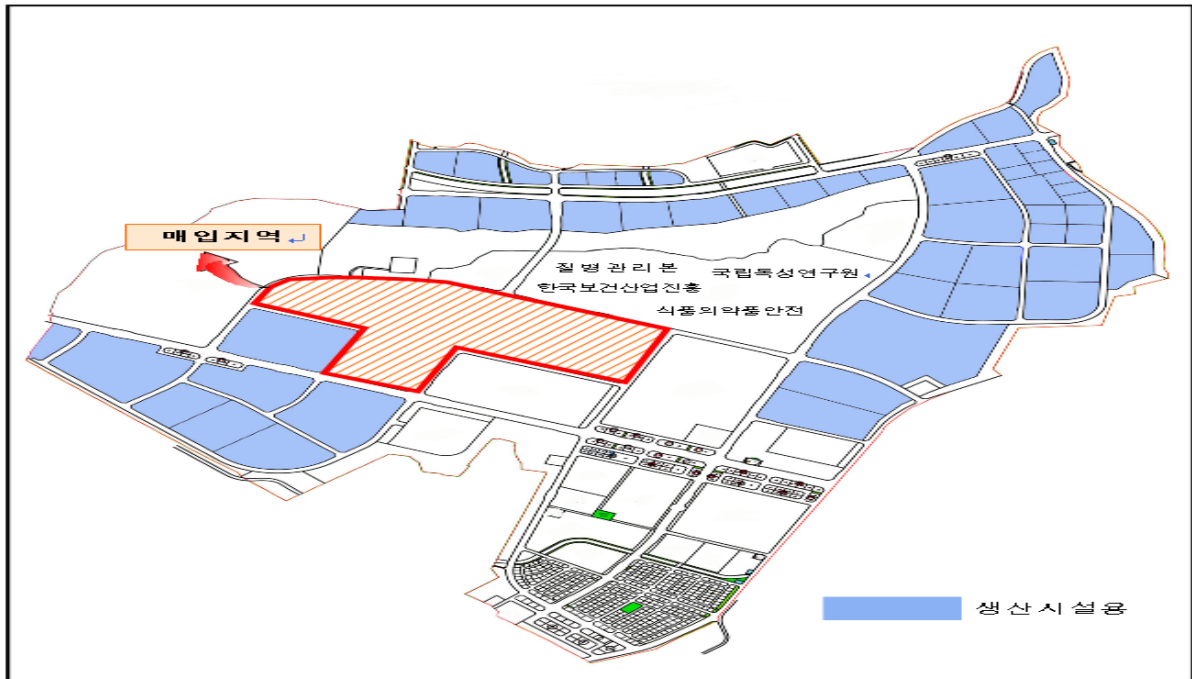

3. 보건환경연구원 이전청사 신축공사

□ 사업개요

○ 사업목적

- 오송생명과학단지내 식·의약품기관과 연계된 검사 효율성 제고
- 청사 신축을 통한 대민서비스 향상 및 도민건강 증진및 환경개선

○ 사업기간 : 2006. 9. ~2010. 6.

○ 사업량 : 5,636.5㎡(지상3층, 지하 1층)

○ 사업내용 : 연구원 이전청사 신축

○ 총 사업비 : 12,000백만원(도비 100%)

- 토지매입비 1,500, 시설비 9,011, 부대공사 334, 기타 1,155

□ 추진계획

총 사업계획			2007년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
5,636㎡	2006. 9. ~ 2010. 6.	12,000백만원	5,636㎡	1,882백만원

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후 집행		
12,000백만원	-	1,491백만원	10,509백만원	12.4%	10.0%

○ 사업추진현황

- 이전청사 신축부지 매입
- 이전청사 신축공사 설계용역 계약


□ 사업효과

- 오송생명과학단지 입주 국책기관과의 연계를 통한 보건·환경 검사 분야의 대민서비스 증대 및 쾌적한 환경 조성

□ 조감도



□ 건축예정부지(오송생명과학단지 30-4블럭)

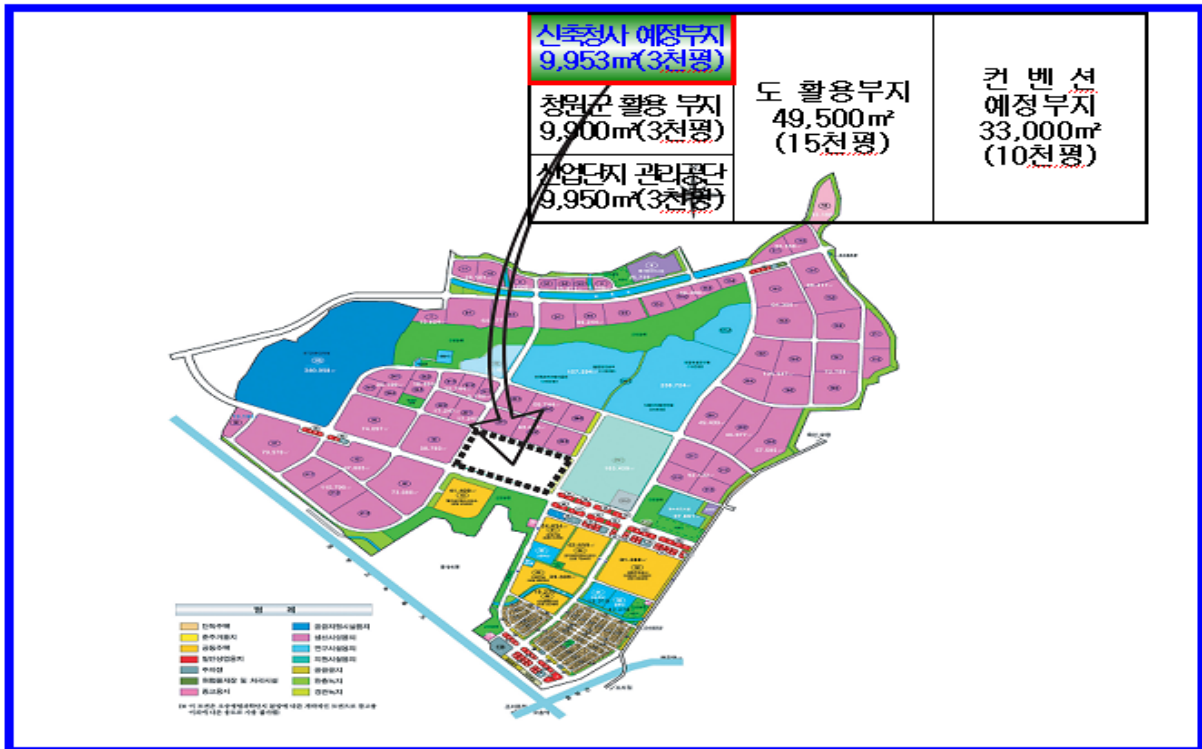

4. 충주의료원 이전신축 BTL 사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 지방의료원 현대화 추진
- 사업기간 : 2007 ~ 2011
- 사업량 : 연면적 28,000m²(지하3층, 지상4층)
- 사업내용 : 충주의료원 이전 신축
- 총사업비 : 59,300백만원(도비 3.7%, 민자 96.3%)
 - 시설비 48,403, 기타 10,897(토지매입, 도시계획시설 결정 등)

□ 추진계획

총 사업계획			2007년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1개소	2007. 07 ~ 2011. 03	59,300백만원	1개소	2,200백만원

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후 집행		
59,300백만원	-	1,000백만원	58,300백만원	1.7%	1.7%

○ 사업추진현황

- BTL 시설사업기본계획 고시
- 부지매입 및 지장물 보상
- 사업설명회 개최 및 현장 답사
- 도시계획시설 결정구역 시행
- 민자사업계획서 평가 완료(우선협상대상자 선정 : 계룡건설산업)

□ 사업효과

- 시설 장비 현대화를 통한 지역 보건서비스 향상
- 지역거점 공공병원의 경쟁력 강화 및 위상 제고

□ 조감도



5. 지방도 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 도내 일원 25개소
- 사업기간 : 2001 ~ 2011
- 사업량 : L=64.5km
- 총사업비 : 2,570억원

□ 추진계획

(단위:백만원)

사업명	총 사업계획			2007년도 사업계획	
	사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
25	64.5		256,645	18.3	54,415
지경 ~ 사리	3.8	'03~'08	12,103	1.6	5,000
금암 ~ 백곡	4.1	'01~'07	9,100	0.3	500
마즈막재 ~ 진의실	2.7	'03~'08	11,423	1.0	3,900
신천 ~ 음성	1.6	'04~'07	6,030	0.6	2,044
판장 ~ 분저	3.2	'04~'07	7,890	1.5	3,550
황석 ~ 구룡	3.0	'04~'09	10,594	0.9	3,000
방곡 ~ 울산	4.8	'04~'10	12,706	1.1	2,700
송치 ~ 가래울	6.3	'04~'10	15,427	1.8	4,200
오창 ~ 증평IC	5.6	'02~'09	47,655	0.8	6,000
성산 ~ 두릉	6.3	'02~'09	49,524	0.7	5,000
부강철도교	0.5	'05~'10	8,294	0.1	1,106
이원 ~ 심천	1.6	'07~'08	3,215	1.0	2,000
세교 ~ 초정	1.9	'07~'09	13,099	0.6	3,565
의풍도로	3.4	'07~'08	3,258	2.1	2,000
충도도로	0.8	'07~'08	1,400	0.7	1,400
가덕도로	1.2	'07~'08	3,300	0.6	1,500
상모 ~ 살미	2.1	'07~'09	8,487	0.5	2,000
신기 ~ 원당	2.3	'07~'10	4,180	0.9	1,500
덕평도로	0.8	'07~'08	2,602	0.5	1,500
백자 ~ 남천	2.3	'06~'10	6,799	0.5	1,400
황간우회도로	0.2	'08	932	0.1	60
문강 ~ 수회	2.1	'08~'11	6,500	0.1	200
장암 ~ 지경	2.3	'08~'11	5,241	0.1	140
부산 ~ 사오	1.2	'08~'11	5,500	0.1	120
덕동교	0.4	'08~'09	1,386	0.1	30

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

사 업 명	예산집행현황(백만원)				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
	사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후집행		
25	256,645	85,527	54,415	116,703	54.5	59.8
지경 ~ 사리	12,103	4,145	5,000	2,958	75.6	85
금암 ~ 백곡	9,100	8,600	500	0	100	100
마즈막재 ~ 진의실	11,423	7,023	3,900	500	95.7	100
신천 ~ 음성	6,030	3,986	2,044	0	100	100
관장 ~ 분저	7,890	4,340	3,550	0	100	100
황석 ~ 구룡	10,594	3,877	3,000	3,717	65.0	55
방곡 ~ 울산	12,706	3,535	2,700	6,471	49.1	60
송치 ~ 가래울	15,427	2,655	4,200	8,572	44.5	55
오창 ~ 증평IC	47,655	24,406	6,000	17,249	63.9	65
성산 ~ 두릉	49,524	21,614	5,000	22,910	53.8	50
부강철도교	8,294	400	1,106	6,788	18.2	10
이원 ~ 심천	3,215	200	2,000	1,015	68.5	80
세교 ~ 초정	13,099	100	3,565	9,434	28.0	15
의풍도로	3,258	-	2,000	1,258	61.4	80
충도도로	1,400	-	1,400	0	100	75
가덕도로	3,300	-	1,500	1,800	45.5	55
상모 ~ 살미	8,487	400	2,000	6,087	28.3	45
신기 ~ 원당	4,180	150	1,500	2,530	39.5	55
덕평도로	2,602	96	1,500	1,006	61.4	75
백자 ~ 남천	6,799	-	1,400	5,399	20.6	65
황간우회도로	932	-	60	872	6.5	10
문강 ~ 수회	6,500	-	200	6,300	3.1	10
장암 ~ 지경	5,241	-	140	5,101	2.7	10
부산 ~ 사오	5,500	-	120	5,380	2.2	10
덕동교	1,386	-	30	1,356	2.2	10

○ 사업추진현황

- 2007년도 54,415백만원(도비 54,415)예산편성
- 정상추진

□ 향후 사업계획

- 지역 균형발전 촉진과 공사지연에 따른 주민불편 최소화를 위해 2008년도 예산(도비)증액 편성 추진

6. 수해상습지 개선사업

□ 사업개요

- 위 치 : 도내일원
- 기 간 : '06. 5. 9 ~ '09. 11. 19
- 사 업 량 : 축제 및 호안 L=73.71km

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

사업명	총 사업계획			2007년도 사업계획	
	사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
계	73.71km		102,103	19.1km	25,010
소여천 소여제	3.82	'06~'08	4,887	1.9	2,497
제천천 주포제	3.88	'06~'09	5,251	1.1	1,500
성암천 문백제	7.01	'06~'09	8,994	1.9	2,454
성암천 사석제	8.73	'06~'09	11,385	3.5	3,733
양성천 본평제	5.10	'06~'08	4,920	1.6	1,500
양성천 돈산제	4.00	'06~'08	4,200	1.6	1,500
달 천 백현제	2.04	'06~'08	3,822	0.8	1,472
초평천 초평제	3.36	'06~'08	4,350	1.2	1,500
삼기천 남차제	4.00	'06~'09	5,600	0.8	1,054
군자천 군자제	2.80	'07~'09	5,100	0.8	1,500
석화천 석화제	3.58	'07~'09	4,400	0.4	776
용두천 오창제	3.30	'07~'09	6,400	0.4	702
안남천 안남제	1.62	'07~'09	2,650	0.4	670
석문동천 안보제	4.30	'07~'09	5,000	0.6	737
한벌천 소이제	3.50	'07~'09	4,998	0.5	730
영평천 이류제	2.20	'07~'09	4,768	0.3	650
압향천 운곡제	3.75	'07~'09	4,850	0.4	558
압향천 부흥제	3.42	'07~'09	5,802	0.4	740
압향천 백봉제	3.30	'07~'09	4,726	0.5	737

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

사업명	예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
	사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후 집행		
계	102,103	14,508	17,929	69,666	31.8	31.8
소여천 소여제	4,887	1,200	1,885	1,802	63.1	58.8
제천천 주포제	5,251	1,200	969	3,082	41.3	41.3
성암천 문백제	8,994	1,900	1,442	5,652	37.2	37.2
성암천 사석제	11,385	2,408	2,159	6,818	40.1	40.1
양성천 본평제	4,920	1,500	894	2,526	48.7	48.7
양성천 돈산제	4,200	1,200	1,229	1,771	57.8	59.1
달 천 백현제	3,822	1,200	1,283	1,339	65.0	65.0
초평천 초평제	4,350	1,200	1,258	1,892	56.5	56.5
삼기천 남차제	5,600	1,500	402	3,698	34.0	33.7
군자천 군자제	5,100	1,200	1,030	2,870	43.7	43.7
석화천 석화제	4,400	-	571	3,829	13.0	13.0
용두천 오창제	6,400	-	585	5,815	9.1	9.1
안남천 안남제	2,650	-	370	2,280	14.0	14.0
석문동천 안보제	5,000	-	651	4,349	13.0	13.0
한별천 소이제	4,998	-	691	4,307	13.8	13.8
영평천 이류제	4,768	-	537	4,231	11.3	11.3
압향천 운곡제	4,850	-	539	4,311	11.1	11.1
압향천 부흥제	5,802	-	732	5,070	12.6	12.6
압향천 백봉제	4,726	-	702	4,024	14.9	14.9

○ 사업추진현황

· 2007년도 사업착수 정상 추진 중

□ 향후 사업계획

○ 연차적으로 사업시행

7. 수해복구 사업

□ 사업개요

- 위 치
 - 단양군 영춘면 동대리 일원
 - 괴산군 불정면 신흥리, 세평리 일원
- 기 간 : '06. 9. 26 ~ '07. 12. 31
- 사 업 량 : 축제 및 호안 L=10.2km, 교량 10개소등
- 예 산 과 목 : 치수및재난관리, 재해대책, 사업예산, 보조사업, 시설비및부대비

□ 추진계획

(단위:백만원)

사업명	총 사업계획			2007년도 사업계획	
	사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
계	10.2km		17,972	10.2km	17,829
동대천수해복구	7.5km	'06. 9 ~ '07. 12	12,326	7.5km	12,190
건개천수해복구	2.7km	'06. 9 ~ '07. 12	5,646	2.7km	5,639

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

사업명	예산집행현황(백만원)				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
	사업비a	기집행b	2007집행c	향후집행		
	17,972	143	17,829	-	100	100
동대천수해복구	12,326	136	12,190	-	100	100
건개천수해복구	5,646	7	5,639	-	100	100

○ 사업추진현황

- 수해복구공사 착공 : '07. 1. 3
- 사업준공 : '07. 12. 31

8. 국가지원지방도

□ 사업개요

- 위치 : 도내 일원 8개소
- 사업기간 : 2000 ~ 2011
- 사업량 : L=52.38km
- 총사업비 : 7,486억원

□ 추진계획

(단위:백만원)

사업명	총 사업계획			2007년도 사업계획	
	사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
8개소	52.38		748,646	2.9	37,065
청천-문광(송면~사기막)	3.90	2003 - 2009	37,179	0.9	6,800
부용-청원IC	7.26	2000 - 2009	107,236	0.4	5,927
청풍대교	1.22	2003 - 2010	56,042	교대,교각	6,500
위림-명지	3.90	2004 - 2008	21,761	0.7	5,775
남일-문의	6.76	2004 - 2010	56,893	0.9	2,548
대전-문의	9.64	2006 - 2011	140,516	교대	7,720
가금-칠금	6.90	2003 - 2009	72,857	교대,교각	1,750
도계-만수	12.80	2006 -	256,162	환경영향평가	45

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

사업명	예산집행현황(백만원)				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
	사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후집행		
8개소	748,646	205,013	37,065	506,568	32.3	25
청천-문광 (송면~사기막)	37,179	25,984	6,800	4,395	88.2	87
부용-청원IC	107,236	87,012	5,927	14,297	86.7	94
청풍대교	56,042	20,746	6,500	28,796	48.6	43
위림-명지	21,761	14,474	5,775	1,512	93	91
남일-문의	56,893	28,103	2,548	26,242	53.9	30
대전-문의	140,516	13,000	7,720	119,796	14.7	6
가금-칠금	72,857	13,006	1,750	58,101	20.3	5
도계-만수	256,162	2,688	45	253,429	1.1	0

○ 사업추진현황

- 2007년도 37,065백만원(국비 31,677, 도비 5,388) 예산편성, 정상 추진

□ 향후 사업계획

- 국지도 지원 국비가 총액배분· 자율편성 예산(균특예산)임을 감안하여 본 사업에 많이 편성되도록 노력하며 사업규모, 공사기간 등을 감안하여 2008년도 지구별 예산 편성, 추진

9. 도시주거환경개선사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 도시저소득주민 밀집지역의 열악한 주거환경개선
- 사업기간 : 2001년 ~ 2010년
- 사업량 : 20개 지구
 - 제1단계 사업('01~'05) : 12개 지구, 제2단계 사업('05~'10) : 8개 지구
- 사업내용 : 도로, 공원, 공용주차장 등 도시기반시설 정비
- 총 사업비 : 71,334백만원(국비50%, 도비10%, 시비40%)

□ 추진계획

총 사업계획			2007년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
20개 지구	2001년~2010년	71,334백만원	3개소	4,036백만원

□ 2007 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후 집행		
71,334백만원	50,796백만원	4,036백만원	16,502백만원	76.9%	65.5%

- 사업추진현황(2007년까지) : 13개 지구 완공
 - 제1단계 사업 : 12개 지구, 제2단계 사업 : 1개 지구 완공

□ 사업효과

- 도시 밀집지역의 열악한 주거환경개선으로 주민의 삶의 질 향상
- 도시기반시설 정비로 지역 균형발전 개발 유도
- 공공시설 정비로 지역 이미지 개선 및 도시 미관 향상

10. 수목원 확대조성사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 향토 자생식물의 유전자원 보존과 연구기능 강화를 위한 수목원 확대조성 및 시설보완
- 사업기간 : 2005 ~ 2009
- 사업량 : 250ha(확장 50ha, 보완 200ha)
- 사업내용
 - 수목전문원 확대조성 : 45개원(특별전문원 16개원, 일반전문원 29개원)
 - 수목산야초 유리온실(1,533㎡), 방문자센터(529㎡), 식물표본관 시설
 - 기반시설 및 편의시설 : 관리도로(1.7km), 잔디광장, 교량(1개소), 쉼터 및 편의시설
- 총 사업비 : 6,000백만원(균특50%, 도비50%)
 - 2007년 : 1,500백만원(균특50%, 도비50%)

□ 추진계획

총 사업계획			2007년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
수목원 확대조성 250ha	2005 ~ 2009	6,000백만원	방문자센터 신축 (529㎡), 수목전문원 조성 (4개원)	1,500백만원

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후 집행		
6,000백만원	3,600백만원	1,500백만원	900백만원	85%	85%

- 사업추진현황 : 방문자센터 신축(529㎡), 수목전문원 조성(4개원)

※ 그간 추진실적

- '05년 추진실적 : 1,600백만원(균특 800, 도비 800)
 - 사업내용 : 수목원 확대조성 기본계획 및 실시설계용역

- '06년 추진실적 : 2,000백만원(균특 1,000, 도비 1,000)
 - 수목산야초유리온실(1,533m²) : 산야초전시원(1,335m²), 나비생태원(198m²)
 - 특별전문원(8개원) : 천연기념수원(1.0ha), 수생식물원(0.42ha), 도민기념식수원(1.0ha), 바이오식물원(0.4ha), 미로원 등
 - 부대공사 : 화장실(34.86m²), 교량(1개소), 잔디광장(2,300m²) 등

□ 사업효과

- 식물 유전자원 보존과 연구기능 강화
- 충북을 대표하는 공립수목원으로서의 역할수행과 속리산 청남대와 연계한 중부권 중심 관광벨트 구축

□ 조감도



11. 대청호 관람데크 조성공사

□ 사업개요

- 사업목적 : 대청호반의 수려한 자연경관을 활용한 관광자원개발
- 사업기간 : 2007.1. ~ 2008.12.
- 사업량 : 대청호 관람데크 1식
- 사업내용 : 대청호 관람데크 시설(1,000m²), 하늘뜰 시설(500m²)
- 총사업비 : 1,000백만원(국비50%, 도비50%)
 - 시설비 994백만원, 시설부대비 6백만원

□ 추진계획

총 사업계획			2007년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
대청호 관람데크 1개소	2007. 1. ~ 2008. 12	1,000백만원	대청호 관람데크 1개소	1,000백만원

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후 집행		
1,000백만원	-	40백만원	960백만원	4%	4.0%

○ 사업추진현황

- 대청호 관람데크 기본 및 실시설계 완료

□ 사업효과

- 청남대의 수려한 자연환경과 대청호반의 수변경관을 활용하여 대청호 관람데크 조성으로 청남대 관광자원 개발 및 지역경제 활성화에 기여

□ 위치도 및 조감도

○ 대청호 관람테크 조성사업

위치도



시설현황도(조감도)



12. 경로당 심야전기보일러 설치 지원사업

□ 사업개요

○ 사업목적

- 고유가 시대를 맞아 경로당 심야전기 보일러 교체를 통한 운영비 절감과 난방 및 온수 사용의 편리성 제고
- 쾌적한 환경 개선으로 노인이 쉽게 접근할 수 있는 건강·교육·문화활동 등 다기능 공간으로 활용

○ 사업기간 : 2006. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.

○ 사업량 : 1,670개소

○ 사업내용 : 난방시설 교체가 시급한 경로당 선정 지원

○ 총사업비 : 11,690백만원(도비50%, 시군비50%)

□ 추진계획

총 사업계획			2007년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1,670개소	2006. 01 ~ 2010. 12	11,690백만원	240개소	1,680백만원

□ 2007 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2007집행(c)	향후 집행		
11,690백만원	1,680백만원	1,680백만원	8,330백만원	28.7%	28.7%

□ 사업효과

- 쾌적한 환경개선으로 건강하고 편안한 노후생활 기여
- 흥미있고 편안한 쉼터를 통하여 수준높은 여가서비스 제공
